

Plan van aanpak

Project Onze Wijk 2010

Plaats, datum: Woudenberg,

Opgesteld door: naam, functie

Opdrachtgever:

Projectleider:(indien van toepassing)

Versie Versie:(maand/jaar)

Becommentarieerd door: datum:

.....(functie)

Aangeboden

aan:

geagendeerd: status:

MT

..... (datum)

.....(goedgekeurd)

College van B&W

..... (datum)

.....(goedgekeurd)

Inhoudsopgave plan van aanpak

1.	<u>Achtergronden</u>	2
2.	<u>De doelstelling (of probleemstelling)</u>	3
3.	<u>De projectopdracht</u>	4
4.	<u>Projectactiviteiten</u>	5
5.	<u>Projectgrenzen</u>	6
6.	<u>De producten, planning en kwaliteit</u>	7
7.	<u>De projectorganisatie</u>	9
8.	<u>Kosten en baten</u>	11
9.	<u>Risico's</u>	12
	<u>Bijlage A</u>	13

1. Achtergrond

Voorheen was het project buurtpreventie een project wat door de politie werd gecoördineerd. De doelstelling was om bewoners te betrekken bij het terugdringen van de criminaliteit. Omdat de politie zich meer is gaan richten op zijn kerntaken is in 2006 het project overgedragen aan de gemeente Woudenberg. Al snel kwam men tot de conclusie dat de doelstelling van het huidige project niet haalbaar was. Een gemeente richt zich namelijk meer op subjectieve en sociale veiligheid en de politie op objectieve en fysieke veiligheid. In 2007 is dan ook de notitie buurtpreventie opgesteld. Doelstelling van het project:

Buurtpreventie heeft tot doel het verbeteren of het op peil houden van het woon- en leefklimaat in gemeente Woudenberg en om werkzaamheden, die gericht zijn op het instandhouden dan wel verhogen van de leefbaarheid in de gemeente, op elkaar af te stemmen en in onderlinge samenhang te brengen.

Eind 2009 is gebleken dat de gestelde doelstelling niet wordt gehaald. Wel is de doelstelling juist geformuleerd maar was deze niet helder bij alle deelnemers van het project en daarmee was het doel van het project onduidelijk. Dit leidde tot een gevarieerde aanpak in de wijken met als gevolg dat het project niet door alle partners werd gedragen. Ook werd de rol van de politie ter discussie gesteld en miste men het draagvlak van de kant van de politie.

Daar ook de naam buurtpreventie niet de juiste doelstelling weergaf van het project is in de vergadering van 1 februari 2010 gekozen voor de naam project Onze Wijk. Om de doelstelling goed te verwoorden is het plan van aanpak project Onze Wijk 2010 opgesteld. Dit met als doel om op een projectmatige manier, conform de gestelde doelstelling het project in 2010 uit te voeren:

Het verhogen van de leefbaarheid in Woudenberg, door middel van het organiseren van activiteiten in de wijk op het gebied van jeugd, sport, veiligheid en welzijn.

De afspraken die voortvloeien uit dit plan van aanpak worden aangepast in het protocol uit 2006 waarin alle partners zich kunnen vinden.

2. De doelstelling (of probleemstelling)

Wijkbewoners kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de eigen woon- en leefomgeving en daarmee de leefbaarheid in de wijk door het organiseren van activiteiten en het ondernemen van acties op het gebied van jeugd, sport, veiligheid en welzijn. Een tweede doelstelling is dat de aangesloten wijkbewoners bij het project onzewijk.nu extra alert zijn op het doorgeven van meldingen via het meldingsysteem. Daarnaast kunnen zij een wijk- of straatgedragen verzoek richten aan de gemeente om een bepaalde wens kenbaar te maken.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hebben het verbeteren van de woon- en leefomgeving hoog op de agenda staan. Dit gaat om zaken die bewoners juist ook heel belangrijk vinden. Dit project wil een grotere zelfredzaamheid en betrokkenheid bij bewoners van de gemeente Woudenberg bereiken, evenals een betere samenwerking met de overheid. Daar tussendoor is een nauwe samenwerking tussen de partners noodzakelijk. Een belangrijk aandeel is het wijkgericht werken waardoor acties gericht zijn op de behoeften in een wijk. De grootste afnemers van het project dienen de inwoners van de gemeente Woudenberg te zijn.

Een ongewenst effect is dat men verwacht dat de veiligheid door het project wordt verbeterd en de onveiligheid daalt. Dit is niet het geval. Men beoogt door middel van het project de leefbaarheid te verhogen en men richt zich niet specifiek op de onveiligheid in de wijken. Om deze verwarring te voorkomen is ook besloten dat de politie niet meer deelneemt aan het overleg platform buurtpreventie wat vanaf heden platform Onze Wijk wordt genoemd. De politie wordt alleen nog benaderd door de projectleider. Dit is de persoon waaraan de wijkcoördinatoren gesignaleerde zaken kunnen melden.

3. De projectopdracht

Het gewenste resultaat is een goed lopende projectorganisatie van het project in de zes wijken van de gemeente Woudenberg waarop wijkgericht niveau acties en activiteiten worden georganiseerd, eventueel in samenwerking met bestaande instanties.

Het project stopt aan het einde van elk jaar. Onder de deelnemers wordt het project geëvalueerd en zo nodig wordt het protocol aangescherpt/aangepast. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld met projectactiviteiten voor het daaropvolgende jaar. Per wijk kan deze verschillen.

De directeur/secretaris van de gemeente Woudenberg is de opdrachtgever van het project. De medewerker rampenbestrijding en openbare orde en veiligheid is de opdrachtnemer van het project en vervult de rol van projectleider (coördinator project onzewijk.nu). De wijkcoördinatoren zijn de projectleden. Zij worden ondersteunt door Vallei Wonen, de huurdersbelangenvereniging en de gemeente Woudenberg in de uitvoering van hun werkzaamheden.

Voor verdere taakverdeling, verantwoordelijkheid en bevoegdheden wordt verwezen naar het protocol onzewijk.nu 2010.

4. Projectactiviteiten

Voor het uitvoeren van de wijkgerichte activiteiten wordt gedacht aan:

- jeugdactiviteiten
- verkeersveiligheid activiteiten
- sportactiviteiten
- wijkactiviteiten (schoonmaakactie)
- communicatie via een wijkcommunity

In wijk 1 (zie bijlage) wordt allereerst een werving gestart naar een wijkcoördinator. Voor de overige wijken wordt gewerkt naar straatcoördinatoren. De taken van een wijk- of straatcoördinator staan vermeld in het protocol onzewijk.nu. Voor het werven verzendt de projectleider een brief aan de wijk. Is er een wijkcoördinator voor een wijk aangewezen dan is deze persoon mede verantwoordelijk voor het verder werven van straatcoördinatoren.

Daarnaast zijn de coördinatoren extra alert op het doorgeven van meldingen vanuit de wijk aan de gemeente en/of de politie. Dit is een taak wat geldt voor elke inwoner van de gemeente Woudenberg. Het is dan ook niet een doel op zich van het project Onzewijk.nu.

Een wijkcoördinator beheert een wijkcommunity. Hij is verantwoordelijk voor de informatie op deze wijkcommunity en verwijdert berichten die schadelijk zijn voor de doelstelling van het project of geen bijdrage leveren aan het project. De wijkcommunity wordt gebruikt om inwoners van een wijk op de hoogte te houden van het project en activiteiten vanuit andere partners.

De politie zal vanaf het jaar 2010 niet actief deelnemen aan de bijeenkomsten van platform buurtpreventie(nu platform Onze Wijk). Zijn er zaken vanuit de wijk wat de politie aangaat, dan wordt dit doorgegeven aan de projectleider. De projectleider treedt vervolgens in overleg met de politie.

5. Projectgrenzen

Afbakenen:

Er zijn activiteiten die niet thuishoren in het project Onzewijk.nu. Hieronder worden deze beschreven.

- Het niet de bedoeling dat de wijk- straatcoördinatoren de rol als buurtbemiddelaar op zich nemen.
- Het is niet de bedoeling dat wijk- straatcoördinatoren verantwoording nemen voor het terugdringen van de criminaliteit. Ze signaleren of horen zaken en geven dit door aan betreffende instantie maar ondernemen niet op eigen initiatief actie. Wordt er iets verwacht dan betreft de betreffende instantie de coördinator erbij.
- Het is niet de bedoeling dat wijk- straatcoördinatoren individuele belangen behartigen.
- Het doen van meldingen aan de politie en de gemeente is geen doel op zich van het project Onzewijk.nu. Dit is een taak wat geldt voor elke inwoner van de gemeente Woudenberg.
- het project richt zich niet op individuele klachten of meldingen. Hiervoor is het meldingenformulier beschikbaar op internet.

Voorwaarden benoemen die noodzakelijk zijn voor het welslagen van het project zijn: GOTIK. Geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit. Zie hiervoor hoofdstuk 6, 7, 8 en 9.


6. De producten, Planning en Kwaliteit

Prioriteiten/doelstellingen project Onze Wijk 2010				
Algemene doelstellingen				
Gemeente	Prioriteiten/beleidsdoelstellingen	Gewenst resultaat	Activiteiten	Planning
	Informatievoorziening aan bewoners	Draagvlak voor het project	Verspreiden nieuwsbrief	3 x per jaar. - januari - mei - september
	gecoördineerde samenwerking in het project	Bevorderen samenwerking met	Platform Onze Wijk 4x per jaar	
	Samenwerking in de wijk	Bevorderen samenwerking onderling in de wijk	Wijkoverleg 4x per jaar	1 of 2 weken voorafgaand aan het overleg platform Onzewijk.nu
	Interactieve communicatie met wijkbewoners	Interactieve communicatie met wijkbewoners bevorderen	Opzetten/gebruiken wijkcommunity	Hele jaar
Doelstellingen per wijk				
Wijk	Prioriteiten/beleidsdoelstellingen	Gewenst resultaat	Activiteiten	Planning
1	Nieuwe buurtcoördinator	volledig gedragen project in wijk 1	Werven doormiddel van bewonersbrief	Febr-10
1	Straatcoördinatoren	Volledig gedragen project in wijk 1	Werven doormiddel van bewonersbrief	Febr-10
2	Veiligere wijk	Bewustwording 30km zones	Verkeersveiligheidsactiviteit	
2	Buurtbewoners bij elkaar brengen	Bevorderen sociale cohesie	Fietstocht met ouderen	
2	Jongeren bij elkaar brengen	Bevorderen sociale cohesie	Voetbaltoernooi	
2	Schone wijk	Betrokkenheid buurtbewoners voor een schone wijk	Schoonmaakactie	

3	Veiligere wijk	Bewustwording 30km zones	Verkeersveiligheidsactiviteit	
3	Buurtbewoners bij elkaar brengen	Bevorderen sociale cohesie	Fietstocht	
3	Jongeren bij elkaar brengen	Bevorderen sociale cohesie	Voetbaltoernooi	
3	Schone wijk		Schoonmaakactie	
3	Buurtbewoners bij elkaar brengen	Bevorderen sociale cohesie	Stimuleren straatbarbecues	
4	Straatcoördinatoren	Volledig gedragen project in wijk 4	Werven doormiddel van bewonersbrief	febr-10
4	Veiligere wijk	Bewustwording parkeren	Verkeersveiligheidsactiviteit	
4	Buurtbewoners bij elkaar brengen	Bevorderen sociale cohesie	Sportactiviteit	
4	Jongeren bij elkaar brengen	Bevorderen sociale cohesie	Jeugdactiviteit	
4	Nulmeting leefbaarheid wijk	Wijkoverzicht	wijkschouw	
4	Schone wijk	Betrokkenheid buurtbewoners voor een schone wijk	Schoonmaakactie	
5	Buurtbewoners bij elkaar brengen	Bevorderen sociale cohesie	Ontbijt met Koninginnedag	
5	Jongeren bij elkaar brengen	Bevorderen sociale cohesie	Visactiviteit	
5	Schone wijk	Betrokkenheid buurtbewoners voor een schone wijk	Schoonmaakactie	
5	Buurtbewoners bij elkaar brengen	Bevorderen sociale cohesie	Stimuleren straatbarbecues	
6	nieuwe buurtcoördinator	Volledig gedragenproject in wijk 6	Werven doormiddel van bewonersbrief	febr-10
6	Straatcoördinatoren	Volledig gedragen project in wijk 6	Werven doormiddel van bewonersbrief	febr-10

7. De projectorganisatie

Hieronder wordt in een organogram weergegeven wie bij het project betrokken zijn en wat hun rol is. De lijnen geven de vorm van samenwerking weer. Voor de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden wordt verwezen naar het protocol project Onze Wijk 2010.

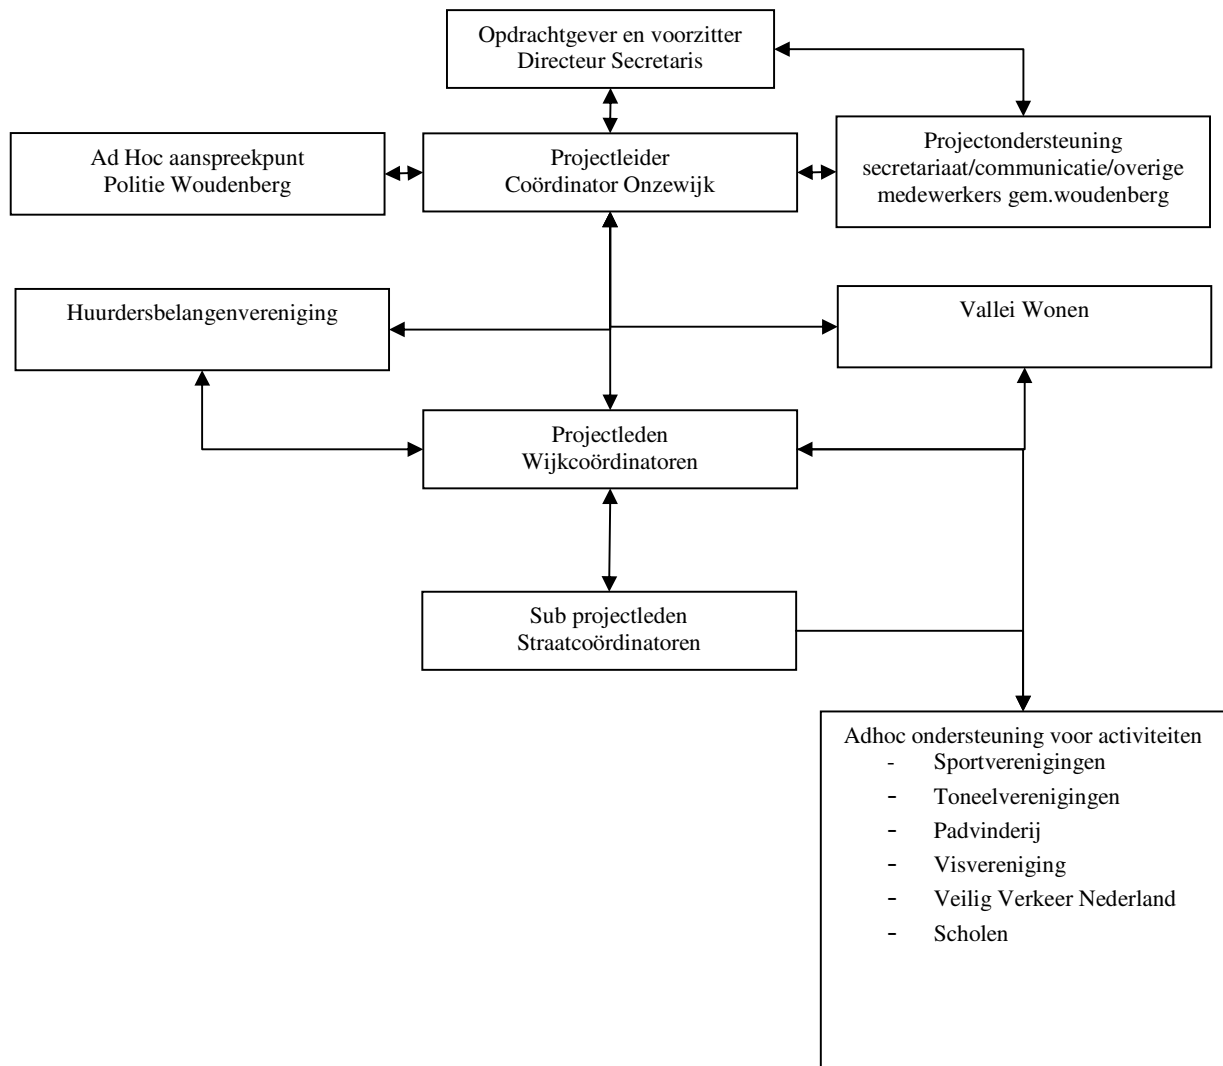

Per jaar wordt er 4x een platform Onzewijk georganiseerd. Hierin worden de activiteiten en de stand van zaken per wijk besproken. Voorafgaand aan dit overleg wordt in elke wijk een wijkoverleg gehouden. Het verslag hiervan wordt voorafgaand aan het overleg platform Onze Wijk verstrekt aan de coördinator Project Onze Wijk

Een verslag van het overleg platform Onze Wijk wordt verstrekt aan de deelnemers. Het

verslag wordt door de buurtcoördinatoren gedeeld met de straatcoördinatoren. Alle verslagen worden bewaard in het archief van de gemeente Woudenberg. Een afschrift van het verslag van het overleg platform Onze Wijk gaat voor kennisgeving langs het college en raad.

De projectleider zorgt voor interne draagvlak voor het project Onze Wijk en betreft indien nodig de interne medewerkers bij het project. Indien nodig brengt de projectleider medewerkers van de gemeente Woudenberg in contact met de buurtcoördinatoren.

8. Kosten en baten

Voor het project Onze Wijk is een budget van € 2500 euro begroot. Daarnaast kan men door het indienen van een jeugd- of wijkinitiatief een beroep doen op het WIN-budget. De activiteit dient dan aan bepaalde criteria te voldoen. De maximale bijdrage is €1000 euro per activiteit. Daarnaast heeft Vallei Wonen een budget van €2500 euro ter beschikking gesteld voor activiteiten in relatie tot het project Onze Wijk.

9. Risico's

Het niet houden aan de afspraken zoals vermeld in dit plan van aanpak vormt een risico voor het slagen van het project. Indien niet aan de afspraken wordt gehouden zal de doelstelling niet worden gehaald en zorgt dit voor een negatieve sfeer in het project. De houding van de deelnemers is hierbij doorslaggevend.

Duidelijkheid project

Indien niet bij alle deelnemers het project duidelijk is vormt dit een bedreiging voor het halen van de doelstelling.

Bijlage A

